Souhrnná zpráva o dosažené úrovni kvality distribuce elektřiny a souvisejících služeb

Příloha č.6 k vyhl. č.540/2005 Sb.

F4423

Držitel licence: **ELPRO-DELICIA, a.s.** LDS: **3+4** Rok: **2025**

Napěťová hladina	nn	vn	vvn	Celkem
Počet zákazníků - distribuce elektřiny (-)	85	16	0	**101**
Celkové množství distribuované elektřiny (MWh)	11 230,868	47 309,634	0,000	**58 540,502**
Celková délka kabelových vedení (km)	16,550	4,430	0,000	**20,980**
Celková délka venkovních vedení (km)	0,000	85,200	0,000	**85,200**

1. Plnění standardů distribuce elektřiny v roce 2025

§	Standard	Počet případů			Počet vyplacených náhrad	Výše vyplacených náhrad	Teoretická výše náhrad*
		Celkem	Standard nedodržen				
		[-]	[-]	[%]	[-]	[Kč]	[Kč]
5	ukončení přerušení distribuce elektřiny	71	0	**0,0%**	0	0	X
6	dodržení plánovaného omezení nebo přerušení distribuce elektřiny	5	0	**0,0%**	0	0	X
7	výměna poškozené pojistky	0	0	**0,0%**	0	0	X
9	lhůty pro vyřízení reklamace na kvalitu napětí	0	0	**0,0%**	0	0	0
10	lhůty pro odstranění příčin snížené kvality napětí	0	0	**0,0%**	0	0	0
11	zaslání stanoviska k žádosti o připojení žadatele k distribuční soustavě	0	0	**0,0%**	0	0	0
12	umožnění distribuce elektřiny	0	0	**0,0%**	0	0	0
13	ukončení přerušení distribuce elektřiny z důvodu prodlení zákazníka nebo dodavatele sdružené služby s úhradou palteb za poskytnutou distribuci elektřiny	0	0	**0,0%**	0	0	0
14	ukončení distribuce elektřiny na žádost dodavatele nebo dodavatele sdružené služby	0	0	**0,0%**	0	0	0
15	výměna měřicího zařízení a vyrovnání plateb	0	0	**0,0%**	0	0	0
16	předávání údajů o měření	0	0	**0,0%**	0	0	0
17	lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování distribuce elektřiny	0	0	**0,0%**	0	0	0
18	dodržení termínu schůzky se zákazníkem	9	0	**0,0%**	0	0	0

** Teoretická výše náhrad - výše náhrad v případě, že by o náhradu požádali všichni zákazníci, kteří měli na poskytnutí náhrad právo*

2. Dosažené hodnoty ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny v roce

Rok: **2025**

Zahrnutá přerušení distrubuce elektřiny		Průměrný počet přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napěťové hladině		Průměrná souhrnná doba trvání přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napěťové hladině		Průměrná souhrnná doba trvání přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napěťové hladině	
		nn	vn	nn	vn	nn	vn
		$SAIFI_{nn}$	**$SAIFI_{vn}$**	**$SAIDI_{nn}$**	**$SAIDI_{vn}$**	**$CAIDI_{nn}$**	**$CAIDI_{vn}$**
		[1/rok]		[min/rok]		[min]	
neplánovaná		0,729	0,563	14,52	18,56	19,9	33,0
z toho	poruchová za obvyklých povětrnostních podmínek (11)	0,000	0,000	0,00	0,00	0,0	0,0
	poruchová způsobená v důsledku zásahu nebo jednání třetí osoby (12)	0,000	0,000	0,00	0,00	0,0	0,0
	ostatní neplánovaná (13+14+15+16)	0,729	0,563	14,52	18,56	19,9	33,0
plánovaná		0,447	0,188	96,58	32,44	216,0	173,0
Celkem	**Hladinové ukazatele**	**1,176**	**0,750**	**111,09**	**51,00**	**94,4**	**68,0**
	Systémové ukazatele	**1,109**		**101,57**		**91,6**	

Rok: **2024**

Celkem	**Hladinové ukazatele**	**1,345**	**0,400**	**69,85**	**46,94**	**51,9**	**117,4**
	Systémové ukazatele	**1,202**		**66,38**		**55,2**	

Rok: **2023**

Celkem	**Hladinové ukazatele**	**2,115**	**1,357**	**97,95**	**17,71**	**46,3**	**13,1**
	Systémové ukazatele	**2,010**		**86,83**		**43,2**	

3. Dosažené hodnoty ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny (SAIFI, SAIDI) pro zákazníky napájené z hladiny nízkého napětí v posledních letech (graficky):

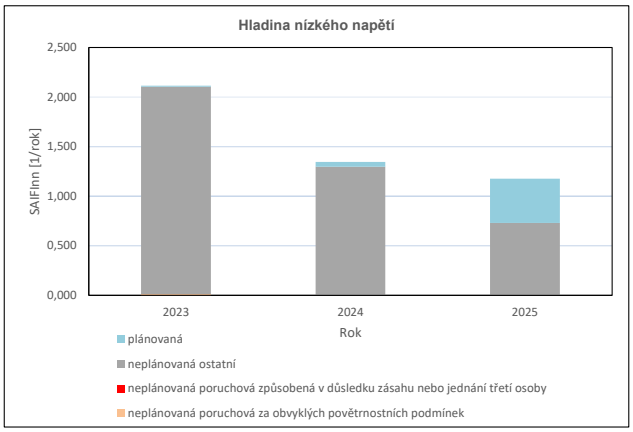

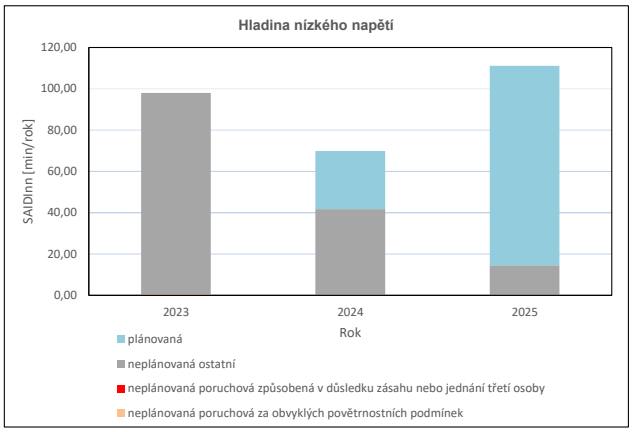

4. Komentář provozovatele distribuční soustavy k hodnocenému období a k dosaženým hodnotám ukazatelů distribuce elektřiny:

V roce 2025, i vzhledem k tomu, že se nevyskytovaly mimořádně nepříznivé povětrnostní podmínky, se oproti předcházejícím rokům snížil počet neplánovaných poruchových přerušení distribuce elektřiny. Naopak došlo k nepatrnému navýšení plánovaných přerušení, vyvolaných provozními potřebami. Dále se pokračuje v průběžně prováděných velkých opravách a rekonstrukcích elektrických sítí a rozvoden a prořezů náletové vegetace v ochranných pásmech nadzemních vedení a trafostanic.
V uvedeném roce 2025 byla dodržena plánovaná omezení nebo přerušení distribuce elektřiny. Nebyla žádná reklamace na kvalitu napětí ani na chybné vyúčtování distribuce elektřiny. Nebyl vznesen žádný požadavek na vyplacení korunových náhrad. Všechna stanoviska k žádostem o připojení žadatele k distribuční soustavě byla zaslána v zákonném termínu. Všechny termíny plánovaných schůzek se zákazníky byly dodrženy. Počet zákazníků distribuce elektřiny na hladinách nn a vn se nezměnil.
